



神戸駅周辺地区浸水対策事業の進捗状況（2024年3月）

雨水幹線のシールド掘削が完了しました。ポンプ場は地下部分から地上部分の工事へと進みます。
2024年2月の工事状況です！

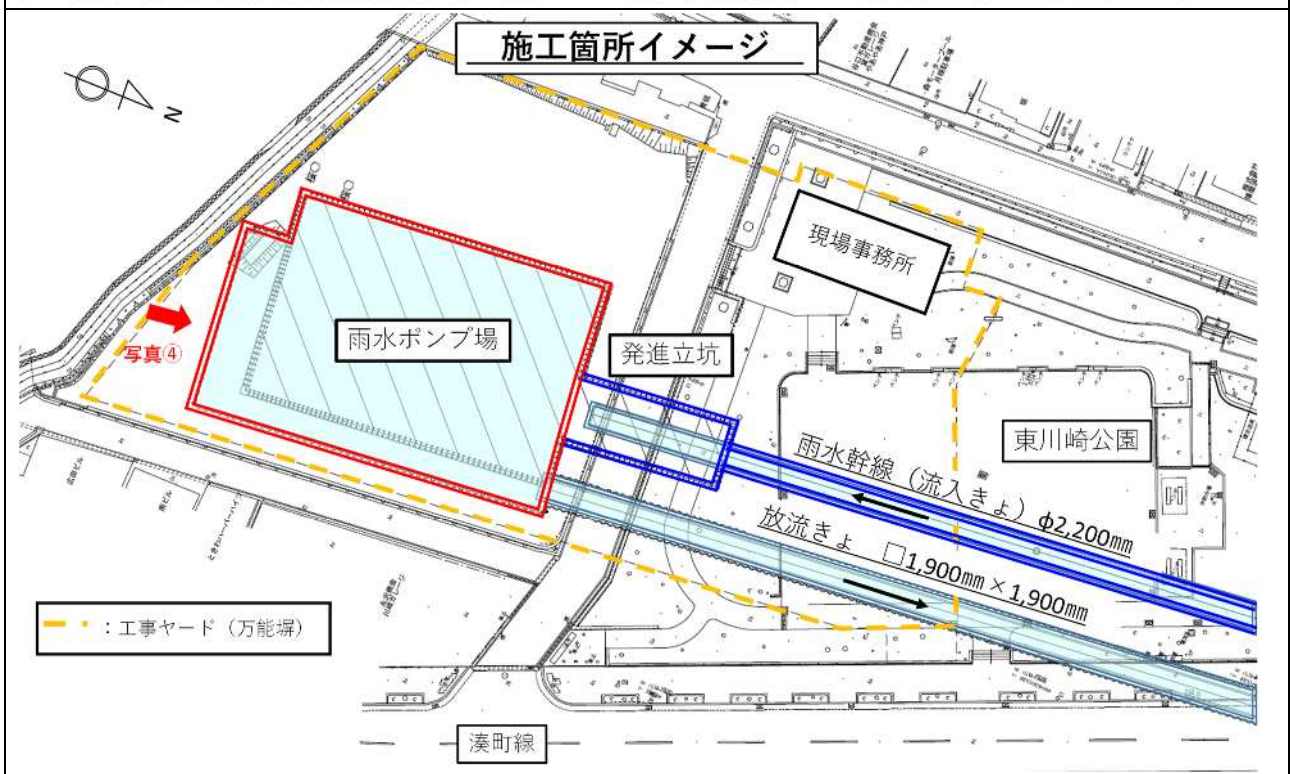

①雨水幹線（2023年11月、掘削が完了し到達立坑にシールドマシンが顔を出しました。）

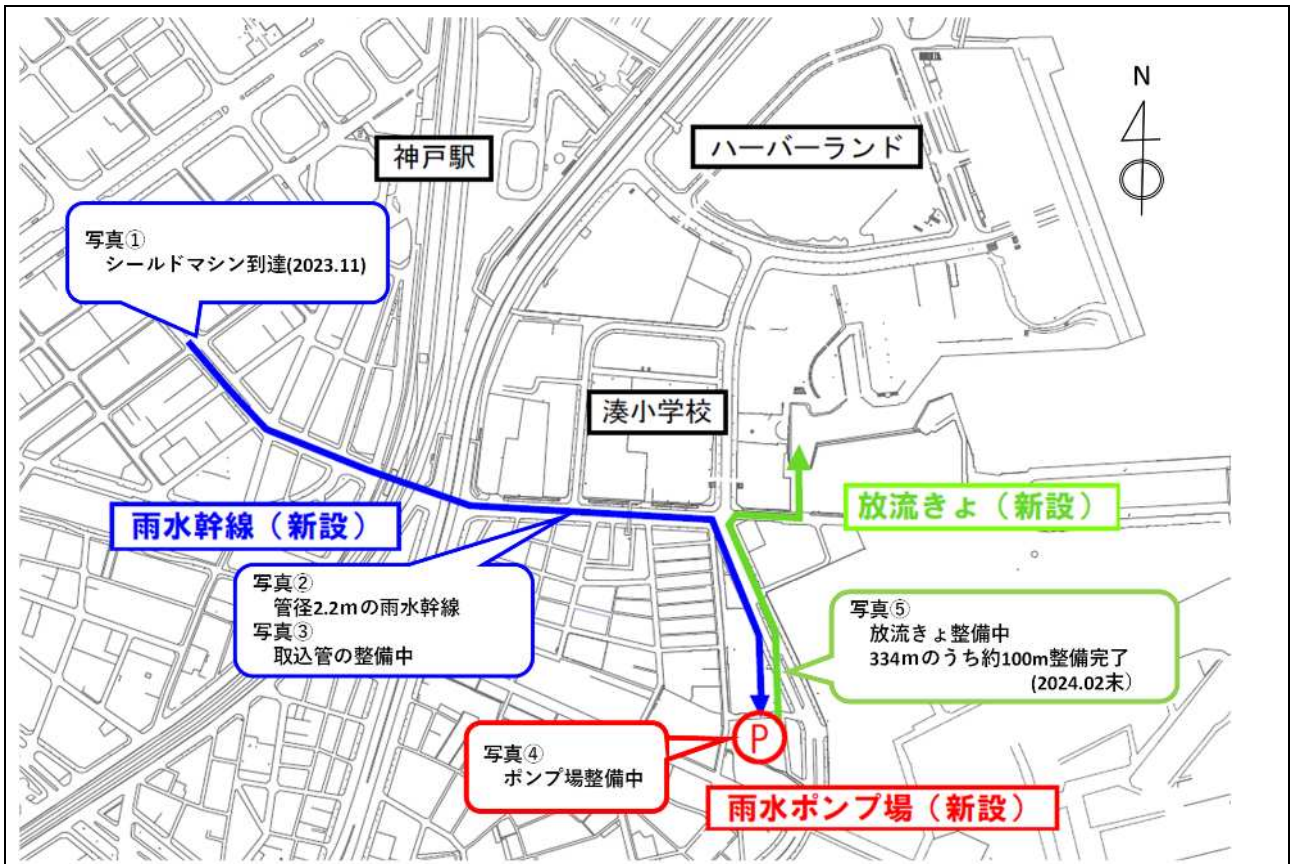

②雨水幹線（管径 2.2mの雨水幹線内部の様子）



③雨水幹線への取込管（中間立坑から推進工法で施工しています）



④ポンプ場（地上高さまでコンクリート打設が完了しました。今後、建築工事に移ります。）



⑤放流きょ（1900mm×1900mmの管きょを整備中です）



⑤ポンプ場（地下2階床までコンクリート打設が完了しました。）



⑥放流きょ（ドローンによる空撮。一部区間が完成しました。）



⑦放流きょ (1900mm×1900mmの放流きょが完成した区間。隣に雨水幹線を築造中です。)



⑧放流きょ (引き続き、残る区間の整備を進めています)

